





Progress Report

ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน

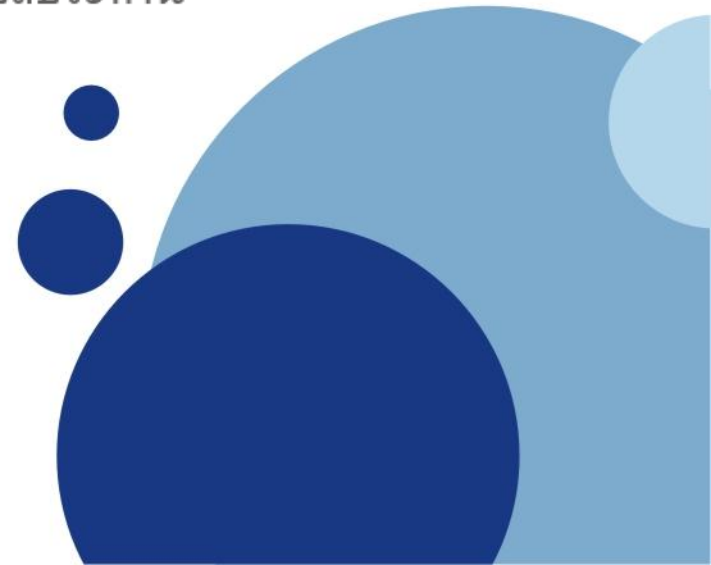




วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ได้รับข้อมูลผลการปฏิบัติงานก่อนสร้างที่แสดงถึงรายละเอียด
รายการงานหลักที่สำคัญของงานก่อสร้างชลประทานในแต่ละประเภทกิจกรรม
พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข


1.2 เพื่อใช้สำหรับติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการประเมินผล
เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

1.3 เพื่อใช้เป็นรายงานต่อผู้บริหารกรมชลประทาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งเผยแพร่ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในรายงาน



ขอบเขต

การจัดทำรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) เป็นการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานแต่ละประเภทกิจกรรมของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 - 13 ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ทั้งงานจ้างเหมาและงานดำเนินการเอง โดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน และจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานความก้าวหน้ารายเดือน

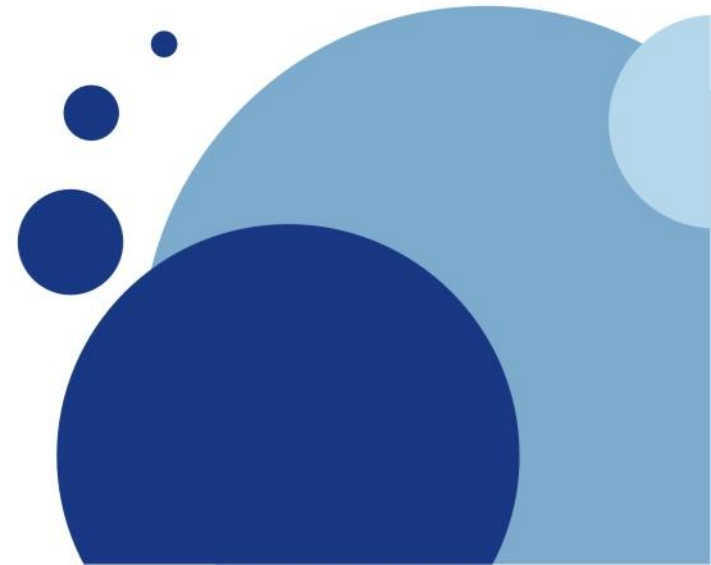

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 - 13

ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผสญ. 1 - 13	รายงาน
ฝ่ายวิศวกรรม	จัดทำและตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์มรายงาน
ฝ่ายก่อสร้าง	รวบรวมข้อมูลตามรายการในรายละเอียดของแบบฟอร์มรายงาน

ส่วนติดตามและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผตป.พญ.	ตรวจสอบรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 1 - 3	ตรวจสอบเล่มสรุปรายงานความก้าวหน้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 1 - 3	รวบรวมรายงานแบบฟอร์ม จัดทำรูปเล่มสรุปรายงานความก้าวหน้า



รายการงานที่ข้อมูล ยังไม่ครบถ้วนและถูกต้อง

1. รายการแก้ไขสัญญา
2. การจัดหาที่ดิน
3. ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย
4. ความก้าวหน้าการก่อสร้าง ประจำปี
5. ปัญหา - อุปสรรค , แนวทางแก้ไข
6. รูปภาพไม่แสดงตรงความก้าวหน้า

แบบฟอร์ม : งานจ้างเหมา

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (จ้างเหมา)

(1) ชื่อหน่วยงาน		(5) วันที่รายงานข้อมูล	
(2) ชื่อโครงการ		(6) ประเภทผลผลิต(ชื่อผลผลิต)	
(3) ที่ตั้งโครงการ		(7) วงเงินทั้งโครงการ (บาท)	
(4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ		(8) วันที่อนุมัติเปิดโครงการ	
(9) วัตถุประสงค์ / ผลผลิตโครงการ (Output)			
(10) ผลประโยชน์ของโครงการ (Outcome)			
(11) ชื่องาน			
(12) ลักษณะงาน			

แบบฟอร์ม : งานจ้างเหมา (ต่อ)

การประกวดราคา				รายละเอียดสัญญา					
(13) ราคากลาง (บาท)				(19) เลขที่สัญญา					
(14) วันที่ประกาศ TOR				(20) วันที่ลงนามในสัญญา					
(15) วันที่ประกาศประกวดราคา				(21) วงเงินสัญญา (บาท)					
(16) วันที่เสนอราคา				(22) ชื่อผู้รับจ้าง					
(17) วันที่พิจารณาความเหมาะสมของราคา				(23) วันที่เริ่มอายุสัญญา					
(18) วันที่อนุมัติรับราคา				(24) วันที่ครบอายุสัญญา					
				(25) ชื่อบริษัทที่ปรึกษา					
				(26) อายุสัญญา					
(27) รายการแก้ไขสัญญา									
(27.1) ครั้งที่	(27.2) รายการแก้ไข	(27.3) วันที่ลงนามแก้ไขสัญญา	(27.4) จำนวน (วัน)	(27.5) วงเงินสัญญาแก้ไข (บาท)	(27.6) วันที่สิ้นสุดสัญญา	(27.7) ระบุเหตุผล			
(28) งานออกแบบ	(28.1) ออกแบบโดย	<input type="checkbox"/> กรมชลประทาน โดย			<input type="checkbox"/> จ้างเหมาออกแบบ โดย				
(29) การมีส่วนร่วมของประชาชน		จำนวน (ครั้ง)		(30) งานสำรวจ					
(29.1) ตั้งแต่เริ่มโครงการ - ก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน (สะสม)				(30.1) วันที่เริ่มปักหลักเขต					
(29.2) ปีงบประมาณปัจจุบัน				(30.2) วันที่จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ					
(29.3) รวมสะสมถึงปัจจุบัน				(30.3) พิกัดงานก่อสร้าง (UTM)					
(31) การจัดหาที่ดิน									
(31.1) ประเภทที่ดิน	จำนวนแปลง	ไร่-งาน-ตร.ว.	(31.2) งบประมาณ (บาท)		(31.3) ผลการเบิกจ่าย(บาท)		(31.4) คงเหลือ (บาท)		
ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์									
ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์									
รวม									
(32) ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย									
(32.1) ประเภทเงินงบประมาณ	R งบปกติ	<input type="checkbox"/> งบ กปร.	<input type="checkbox"/> งบอื่นๆ ระบุ.....						
(32.2) ปีงบประมาณ	(32.3) งบประมาณทั้งหมด	(32.4) แผนเบิกจ่ายสะสม		(32.5) ผลเบิกจ่ายเดือนปัจจุบัน		(32.6) ผลเบิกจ่ายสะสม		(32.7) คงเหลือ	(32.8) ผลเบิกจ่ายเทียบงบประมาณ ทั้งหมด %
		บาท	%	บาท	%	(32.6.1) เดือนก่อน	(32.6.2) ปัจจุบัน		
	(1)	(2)	(3)=(2)*100/(1)	(4)	(5)=(4)*100/(1)	(6)	(7)=(4)+(6)	(8)=(1)-(7)	(9)=(7)*100/(1)
(32.2.1) สิ้นถึงปีก่อน									
(32.2.2) ปีปัจจุบัน									
รวม									

แบบฟอร์ม : งานจ้างเหมา (ต่อ)

(35) ความก้าวหน้าการก่อสร้างเทียบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	หมายเหตุ
(35.1) แผนงานก่อสร้าง(%)													
(35.2) ผลงานก่อสร้าง (%)													
(35.3) แผนการเบิกจ่าย (บาท)													
(35.4) แผนการเบิกจ่าย (%)													
(35.5) ผลการเบิกจ่าย (บาท)													
(35.6) ผลการเบิกจ่าย (%)													

(37) ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหา	แนวทางการแก้ไข

แบบฟอร์ม : งานจ้างเหมา (ต่อ)

(38) รูปภาพประกอบการปฏิบัติงาน




คำอธิบายภาพ



คำอธิบายภาพ



คำอธิบายภาพ



คำอธิบายภาพ

แบบฟอร์ม : งานดำเนินการเอง

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (ดำเนินการเอง)

(1) ชื่อหน่วยงาน		(5) วันที่รายงานข้อมูล	
(2) ชื่อโครงการ		(6) ประเภทผลผลิต(ชื่อผลผลิต)	
(3) ที่ตั้งโครงการ		(7) วงเงินทั้งโครงการ (บาท)	
(4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ		(8) วันที่อนุมัติเปิดโครงการ	
(9) วัตถุประสงค์ / ผลผลิตโครงการ (Output)			
(10) ผลประโยชน์ของโครงการ (Outcome)			
(11) ชื่องานดำเนินการเอง			
(12) วงเงินงบประมาณทั้งงาน		(14) ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง	
(13) วงเงินที่ได้รับจัดสรร			
(15) ลักษณะงาน			
(16) งานออกแบบ	(16.1) ออกแบบโดย	<input type="checkbox"/> กรมชลประทาน โดย	<input type="checkbox"/> จ้างเหมาออกแบบ โดย

แบบฟอร์ม : งานดำเนินการเอง (ต่อ)

(17) การมีส่วนร่วมของประชาชน		จำนวน (ครั้ง)		(18) งานสำรวจ							
(17.1) ตั้งแต่เริ่มโครงการ -ก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน (สะสม)				(18.1) วันที่เริ่มปีกลักเขต							
(17.2) ปีงบประมาณปัจจุบัน				(18.2) วันที่จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ							
(17.3) รวมสะสมถึงปัจจุบัน				(18.3) พักตงานก่อสร้าง (UTM)							
(19) การจัดหาที่ดิน											
(19.1) ประเภทที่ดิน	จำนวนแปลง	ไร่-งาน-ตร.ว.	(19.2) งบประมาณ (บาท)		(19.3) ผลการเบิกจ่าย		(19.4) คงเหลือ (บาท)				
			(19.2.1) จำนวนเงิน(บาท)	(19.2.2) จำนวนที่ดิน(ไร่)	(19.3.1) จำนวนเงิน(บาท)	(19.3.2) จำนวนที่ดิน(ไร่)	(19.4.1) จำนวนเงิน(บาท)	(19.4.2) จำนวนที่ดิน(ไร่)			
ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์											
ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์											
รวม											
(20) การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหลัก											
(20.1) รายการ	(20.2) ปริมาณ	(20.3) หน่วย	(20.4) วงเงิน (บาท)	(20.5) โดยวิธี	(20.6) ประกาศ	(20.7) วันจัดซื้อ - จัดหา	(20.8) วันทำข้อผูกพัน	(20.9)ระยะเวลาการส่งมอบ	(20.10)วันที่เบิกจ่าย	(20.11) ผลสะสม	
										เบิกจ่าย (บาท)	
	แผน										
	ผล										
	แผน										
	ผล										
	แผน										
	ผล										
	แผน										
	ผล										
	แผน										
	ผล										
	แผน										
	ผล										
	แผน										
	ผล										
	แผน										
	ผล										
	แผน										
	ผล										

แบบฟอร์ม : งานดำเนินการเอง (ต่อ)

(24) ความก้าวหน้าการก่อสร้างเทียบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561


รายการ	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	หมายเหตุ
(24.1) แผนงานก่อสร้าง (%)													
(24.2) ผลงานก่อสร้าง (%)													
(24.3) แผนการเบิกจ่าย (บาท)													
(24.4) แผนการเบิกจ่าย (%)													
(24.5) ผลการเบิกจ่าย (บาท)													
(24.6) ผลการเบิกจ่าย (%)													

(25) ปัญหาและอุปสรรค


ปัญหา	แนวทางการแก้ไข

แบบฟอร์ม : งานดำเนินการเอง (ต่อ)


(26) รูปภาพประกอบการปฏิบัติงาน




คำอธิบายภาพ



คำอธิบายภาพ



คำอธิบายภาพ



คำอธิบายภาพ

งานรายสัญญา/โครงการก่อสร้าง

สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่	โครงการ	รายการ	งบประมาณตาม พรบ	ประเภทผลผลิต
สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1		งานจ้างเหมา		
	โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	(1) จ้างเหมา อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัดแม่กวาง สัญญาที่ 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	151,707,000	
		(2) จ้างเหมา อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัดแม่กวาง สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	630,235,500	
		(3) จ้างเหมา อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตงแม่จัด สัญญาที่ 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	242,880,000	
		(4) จ้างเหมา อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตงแม่จัด สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	151,787,000	
		ดำเนินการเอง		
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	(5) งานระบบท่อส่งน้ำแม่จัด-แม่แตง และอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อน แม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	189,591,200		
สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2		งานจ้างเหมา		
	โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี	(1) จ้างเหมา ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	64,060,300	
	โครงการคลองระบายน้ำหลาก บาง บาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	(2) จ้างเหมา ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาลและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	40,768,000	

ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน

งานรายสัญญา/โครงการก่อสร้าง (ต่อ)

สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่	โครงการ	รายการ	งบประมาณตาม พรบ	ประเภทผลผลิต
สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3	งานจ้างเหมา			
	โครงการระบบส่งน้ำประดูระบายน้ำ น้ำท่าตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพน ทอง จังหวัดนครพนม	(1) จ้างเหมา ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประดูระบายน้ำน้ำท่าตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้าน โพนทอง จังหวัดนครพนม	63,498,500	ผลผลิต : การจัดหาแหล่ง น้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
	โครงการประดูระบายน้ำบ้านห้วย ทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ	(2) จ้างเหมา ประดูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประดูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ	109,945,700	ผลผลิต : การจัดหาแหล่ง น้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
	ดำเนินการเอง			
	โครงการประดูระบายน้ำบ้านหนอง บัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม	(3) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประดูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม	29,400,000	ผลผลิต : การจัดหาแหล่ง น้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
โครงการระบบส่งน้ำประดูระบายน้ำ น้ำท่าตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่า กตกาล จังหวัดนครพนม	(4) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประดูระบายน้ำน้ำท่าตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่าก กตกาล จังหวัดนครพนม	78,400,000	ผลผลิต : การจัดหาแหล่ง น้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน

งานรายสัญญา/โครงการก่อสร้าง (ต่อ)

สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่	โครงการ	รายการ	งบประมาณตาม พรบ	ประเภทผลผลิต
สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4		งานจ้างเหมา		
	โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัด อุดรดิตถ์	(1) จ้างเหมา ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่1 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัด อุดรดิตถ์	175,489,500	
		(2) จ้างเหมา ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์	130,572,000	
		(3) จ้างเหมา โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์	7,600,000	
		(4) จ้างเหมา โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์	35,912,500	
		(5) จ้างเหมา ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ โครงการเขื่อน ทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์	28,262,500	
		(6) จ้างเหมา ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลจัวงาม อำเภอเมือง โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัด อุดรดิตถ์	7,600,000	
สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5		ดำเนินการเอง		
	โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัด น่าน	(1) ฝายหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นและระบบส่งน้ำ โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	117,600,000	ผลผลิต : การจัดหาแหล่ง น้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
		งานจ้างเหมา		
	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	(2) จ้างเหมา เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นน้ำปี้ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	155,833,200	ผลผลิต : การจัดหาแหล่ง น้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน

งานรายสัญญา/โครงการก่อสร้าง (ต่อ)


สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่	โครงการ	รายการ	งบประมาณตาม พรบ	ประเภทผลผลิต
		งานจ้างเหมา		
สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	(1) จ้างเหมา เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	8,817,900	ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	(2) จ้างเหมา เชื้อนปิดช่องเขาและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	62,406,400	ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
	โครงการสถานีสูบน้ำห้วยขาม จังหวัดระยอง	(3) จ้างเหมา สถานีสูบน้ำคลองห้วยขาม โครงการสถานีสูบน้ำห้วยขาม จังหวัดระยอง	52,638,800	ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
	โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองห้วยขาม จังหวัดระยอง	(4) จ้างเหมา สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองห้วยขาม จังหวัดระยอง	7,674,300	ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
		ดำเนินการเอง		
	โครงการระบบชลประทานส่วนขยาย อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	(5) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	105,840,000	ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	(6) คันกันน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	74,480,000	ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองห้วยขาม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	(7) ระบบระบายน้ำบ้านหนองโพรง (ระยะที่ 2) โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองห้วยขาม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	45,197,600	ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	

ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน

งานรายสัญญา/โครงการก่อสร้าง (ต่อ)

สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่	โครงการ	รายการ	งบประมาณตาม พรบ	ประเภทผลผลิต
สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7		งานจ้างเหมา		
	โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	(1) จ้างเหมา ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	111,607,000	
		(2) จ้างเหมา ระบบชลประทานฝั่งขวา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	45,835,800	
		(3) จ้างเหมา ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	76,297,200	
สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8		งานจ้างเหมา		
	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	(1)จ้างเหมา คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	180,902,900	
		(2)จ้างเหมา คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	62,720,000	
		ดำเนินการเอง		
สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมระบบส่งน้ำลาดาวรี PR1 จังหวัดอุบลราชธานี	(3) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดาวรี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โครงการสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำลาดาวรี PR1 จังหวัดอุบลราชธานี	133,280,000		


ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน



งานรายสัญญา/โครงการก่อสร้าง (ต่อ)

สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่	โครงการ	รายการ	งบประมาณตาม พรบ	ประเภทผลผลิต
		งานจ้างเหมา		
สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโดนด	(1) จ้างเหมา ประตุระบายน้ำบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ในลุ่มน้ำวังโดนด	7,009,000	ผลผลิต : การจัดหาแหล่ง น้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
	โครงการสถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ	(2) จ้างเหมา สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ	126,344,000	ผลผลิต : การป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ
		ดำเนินการเอง		
	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโดนด ตำบลวัง ใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	(3) งานก่อสร้างประตุระบายน้ำบ้านคลองเรา โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโดนด ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	93,100,000	ผลผลิต : การจัดหาแหล่ง น้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน

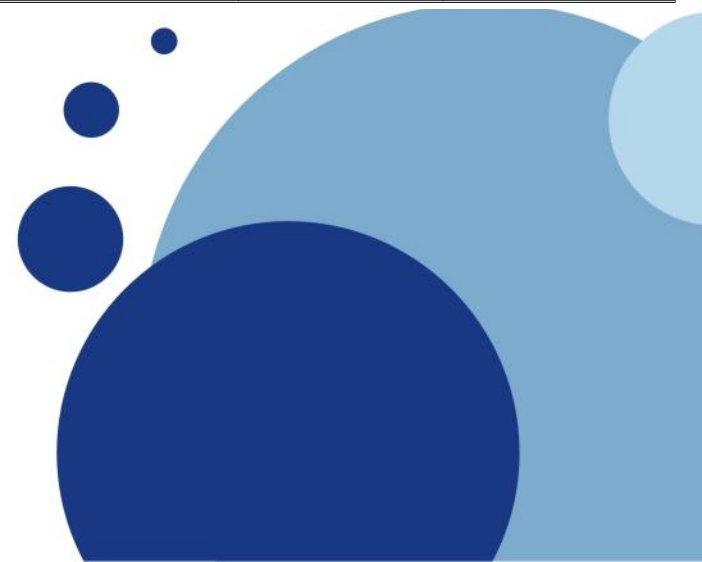

งานรายสัญญา/โครงการก่อสร้าง (ต่อ)

สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่	โครงการ	รายการ	งบประมาณตาม พรบ	ประเภทผลผลิต
		งานจ้างเหมา		
สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	(1) จ้างเหมา ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	105,258,600	
	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง นครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	(2) งานจ้างเหมา งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง นครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	165,874,800	
	โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	(3) ค่าจ้างเหมา ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด นครศรีธรรมราช	183,769,600	
	โครงการประตुरะบายน้ำ บ้านหาดแดง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่า แซะ จังหวัดชุมพร	(4) จ้างเหมา ประตुरะบายน้ำบ้านหาดแดงพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตुरะบายน้ำ บ้านหาดแดง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	44,678,000	ผลผลิต : การจัดหาแหล่ง น้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
		ดำเนินการเอง		
	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	(5) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	95,000,000	
		(6) ระบบส่งน้ำ MC2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	90,000,000	
		(7) คลองส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	87,000,000	
	โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่ง น้ำบ้านหงษ์เจริญ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	(8) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหงษ์เจริญ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร	39,603,800	ผลผลิต : การจัดหาแหล่ง น้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน


งานรายสัญญา/โครงการก่อสร้าง (ต่อ)

สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่	โครงการ	รายการ	งบประมาณตาม พรบ	ประเภทผลผลิต
		งานจ้างเหมา		
สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11	โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอ หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	(1) จ้างเหมา ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอ หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	304,244,000	
		(2) จ้างเหมา งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอ หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	162,255,200	
		(3) จ้างเหมา งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอ หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	150,769,600	
		(4) จ้างเหมา งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอ หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	117,181,400	
	โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง	(5) จ้างเหมา คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง	136,226,400	ผลผลิต : การป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ
		ดำเนินการเอง		
	โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอ หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	(6) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่(ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	150,000,000	
	โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	(7) อาคารประกอบคลองนาทวี โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	68,600,000	ผลผลิต : การป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ
	โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัด ตรัง	(8) อาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	39,200,000	ผลผลิต : การป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ


งานรายสัญญา/โครงการก่อสร้าง (ต่อ)

สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่	โครงการ	รายการ	งบประมาณตาม พรบ	ประเภทผลผลิต
สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12		งานจ้างเหมา		
	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อน เนื่องจากพระราชดำริ จังหวัด อุดรดิตถ์	(1) จ้างเหมา เชื้อเพลิงงานและอาคารประกอบพร้อมโม่งค้ส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์	99,986,600	
		(2) จ้างเหมา ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์	174,825,000	
		(3) จ้างเหมา ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์	112,896,000	
		ดำเนินการเอง		
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อน เนื่องจากพระราชดำริ จังหวัด อุดรดิตถ์	(4) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบสายบ้านสีเสียด-จันทาม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์	22,540,000		
สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13		ดำเนินการเอง		
	โครงการปรับปรุงเขตร ตำบลโคก สะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ	(1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงเขตร ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	88,200,000	ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
	โครงการประตुरะบายน้ำพระอาจารย์ จื่อ(ลำเชียงทา) ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	(2) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำบึงระเหวและอาคารประกอบ โครงการประตुरะบายน้ำพระอาจารย์จื่อลำเชียงทา ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	82,983,000	ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน



จบการนำเสนอ

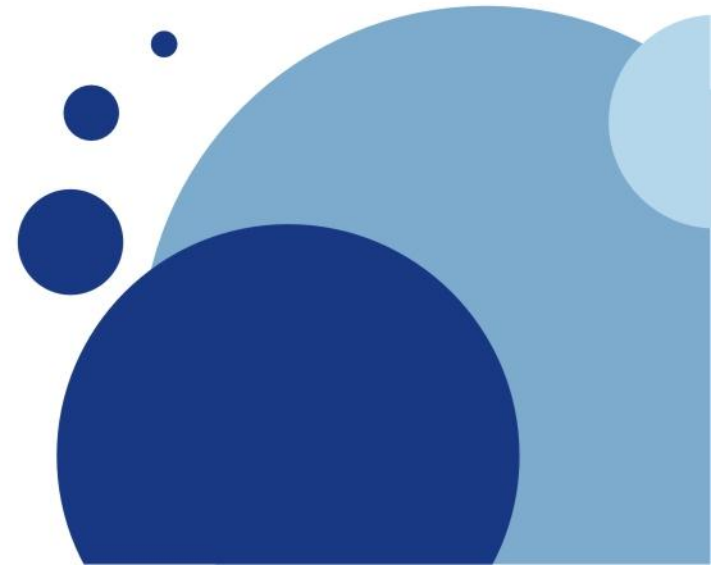

ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน
